


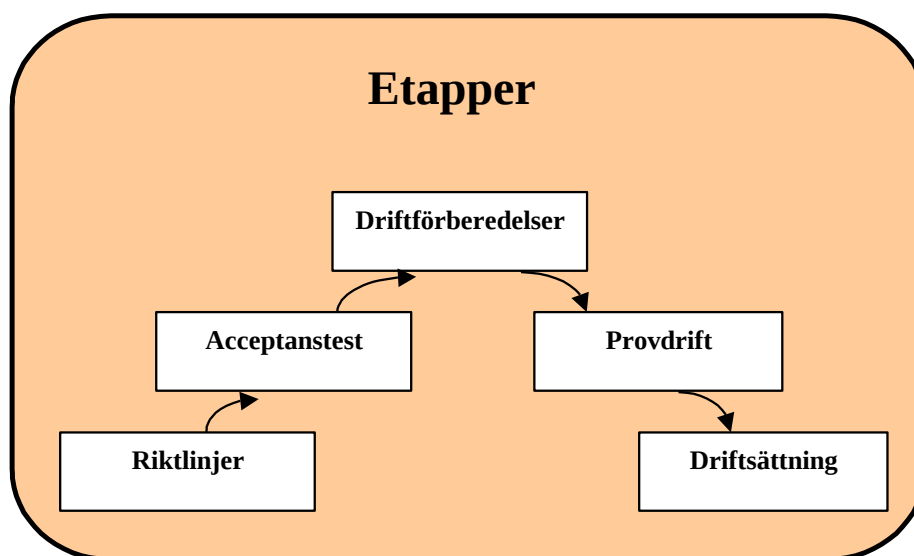


Innehållsförteckning

4 Etapper och resultat	2
4.1 Riktlinjer	2
4.2 Acceptanstest	3
4.3 Driftförberedelser	4
4.4 Provdrift	5
4.5 Driftsättning	6

4 Etapper och resultat

4.1 Riktlinjer

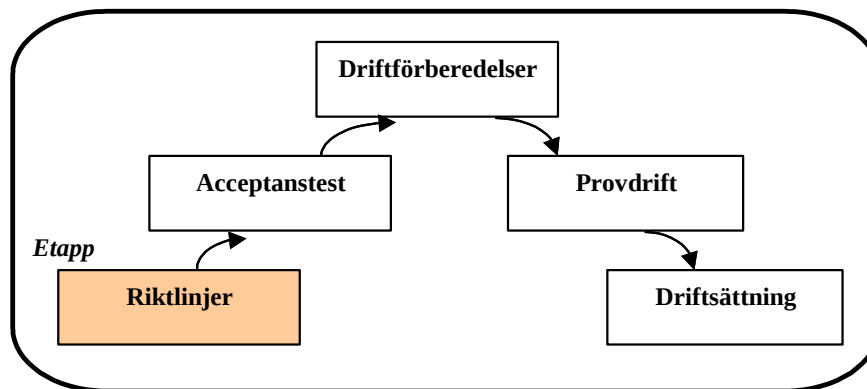

Mål

Att med projektbeskrivningen som utgångspunkt ta fram riktlinjer i form av strategier, grova planer, ambitionsnivåer etc för olika aktiviteter i projektet förankrade och fastställda.
Driftmiljö och teknisk plattform fastställda.


Underlag/förutsättningar

- Projektbeskrivning.
- Nuvarande användare.
- Nuvarande arbetsrutiner.
- Befintlig teknisk plattform.
- Nuvarande system med kopplingar.
- Befintligt behörighetssystem.
- Organisationens säkerhetspolicy.
- Kravspecifikation nytt system.
- Systemdokumentation nytt system.
- Testrapporter från genomförda tester.
- Konverteringsprogram med dokumentation.

Resultat

- Underlag/förutsättningar för att göra systemet körbart klara.
- Acceptanstestförberedelser klara.
- Tekniska plattformen uppgraderad, anpassad säkerhet, anpassat behörighetssystem.
- Fastställda behörighetsprofiler.
- Grov avvecklingsplan nuvarande system.
- Fastställd ambitionsnivå för rutinöversynen.
- Utbildningsstrategi.
- Grov utbildningsplan.
- Dokumentationsstrategi.
- Konverteringsstrategi.
- Driftsättningsplan.

4.2 Acceptanstest

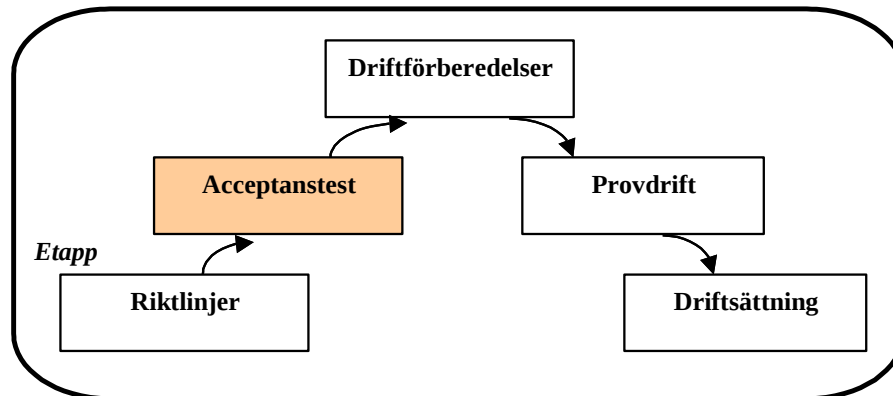

Mål

Det nya systemet eller nya systemversionen levererat och godkänt av beställaren. Driftförberedelserna följer fastställda riktlinjer och den grova planen.


Underlag/förutsättningar

- Underlag/förutsättningar för att göra systemet körbart klara.
- Acceptanstestförberedelser klara.
- Tekniska plattformen uppgraderad, anpassad säkerhet, anpassat behörighetssystem.
- Fastställda behörighetsprofiler.
- Grov avvecklingsplan nuvarande system.
- Fastställd ambitionsnivå för rutinöversynen.
- Utbildningsstrategi.
- Grov utbildningsplan.
- Dokumentationsstrategi.
- Konverteringsstrategi.
- Driftsättningsplan.

Resultat

- Systemet acceptanstestat enligt testplan.
- Acceptanstrappport.
- Tekniska plattformen, säkerheten och behörighetssystemet verifierad.
- Anpassade regler/rutiner för versionshantering.
- Detaljerad avvecklingsplan.
- Förändringsbehov (organisation, bemanning, arbetsrutiner).
- Utformning av arbetsrutiner påbörjad.
- Detaljerad utbildningsplan påbörjad.
- Utbildningsförberedelser (utbildningsmaterial, körschema lektioner m m) påbörjade.
- Iordningställd utbildningsmiljö.
- Dokumentation (acceptanstestversion).
- Tidplan och resursplan för användarstöd.
- Provdriftplan.
- Grov konverteringsplan.
- Omlägningsstrategi.
- Driftkrav.
- Underlag för valtningsöverlämnande.

4.3 Driftförberedelser

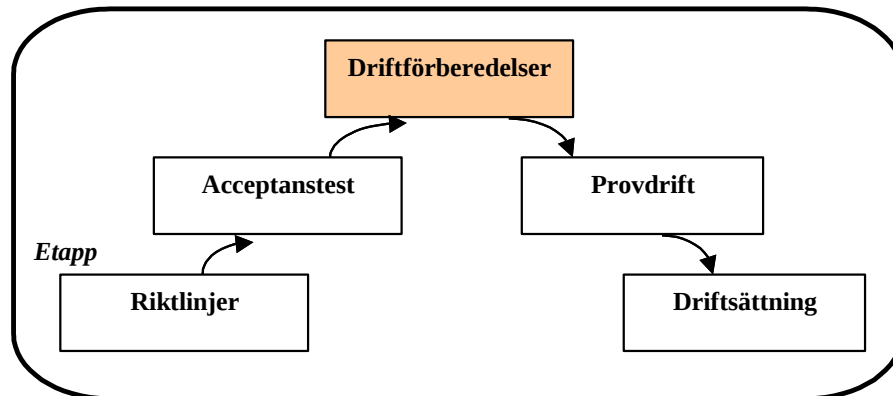

Mål

Samtliga driftförberedelser klara enligt fastställda riktlinjer och den grova planen. Det nya systemet eller nya systemversionen klart för provdrift.


Underlag/förutsättningar

- Systemet acceptanstestat enligt testplan.
- Acceptanstrappport.
- Tekniska plattformen, säkerheten och behörighetssystemet verifierad.
- Anpassade regler/rutiner för versionshantering.
- Detaljerad avvecklingsplan.
- Förändringsbehov (organisation, bemanning, arbetsrutiner).
- Utformning av arbetsrutiner påbörjad.
- Detaljerad utbildningsplan påbörjad.
- Utbildningsförberedelser (utbildningsmaterial, körschema lektioner m m) påbörjade.
- Iordningställd utbildningsmiljö.
- Dokumentation (acceptanstestversion).
- Tidplan och resursplan för användarstöd.
- Provdraftplan.
- Grov konverteringsplan.
- Omlägningsstrategi.
- Driftkrav.
- Underlag för valtningsöverlämnande.

Resultat

- Systemet körbart i utbildningsmiljön.
- Testade kopplingar.
- Befintligt system klart för avveckling.
- Utformade arbetsrutiner.
- Detaljerad utbildningsplan klar.
- Utbildningsförberedelser (utbildningsmaterial, körschema lektioner m m) klara.
- Dokumentation (provdraftversion).
- Bemannad resursplan för användarstöd.
- Förberedelser för provdriften klara.
- Iordningställd provdriftmiljö.
- Konverteringsinstruktioner/regler.
- Detaljerad plan för provdriftkonverteringen.
- Omlägningsplan för provdrift.
- Förberedelser för provdrift klara.
- Driftorganisation, driftutiner, drifttehandbok och driftavtal.
- Plan för förvaltningsöverlämnande.

4.4 Provdrift

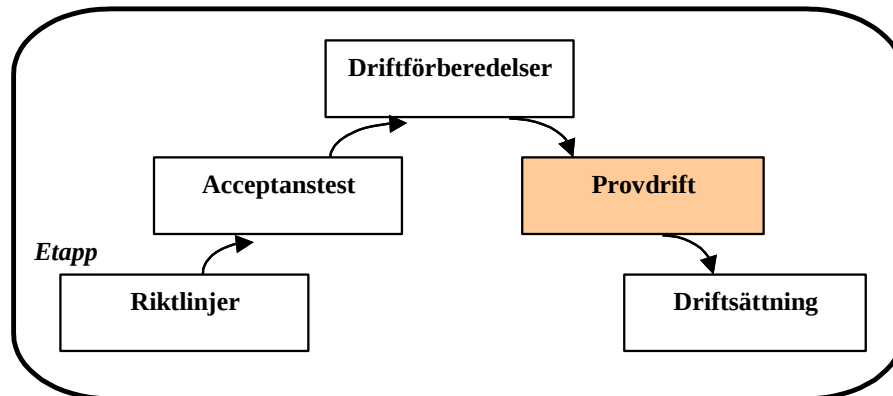

Mål

Det nya systemet eller nya systemversionen kört i provdrift och godkänt för driftsättning. Samtliga förberedelser för driftsättning klara.


Underlag/förutsättningar

- Systemet körbart i utbildningsmiljön.
- Testade kopplingar.
- Befintligt system klart för avveckling.
- Utformade arbetsrutiner.
- Detaljerad utbildningsplan klar.
- Utbildningsförberedelser (utbildningsmaterial, körschema lektioner m m) klara.
- Dokumentation (provdriftversion).
- Bemannad resursplan för användarstöd.
- Förberedelser för provdriften klara.
- Iordningställd provdriftmiljö.
- Konverteringsinstruktioner/regler.
- Detaljerad plan för provdriftkonverteringen.
- Omlägningsplan för provdrift.
- Förberedelser för provdrift klara.
- Driftorganisation, driftrutiner, drifthandbok och driftavtal.
- Plan för förvaltningsöverlämnande.

Resultat

- Provdriften genomförd på ett säkert och samordnat sätt enligt provdriftplan.
- Godkända kopplingar.
- Befintligt system godkänt för avveckling.
- Anpassad organisation, avstämda arbetsrutiner.
- Genomförd utbildning för provdrift.
- Fungerande utbildningssupport, lärarpool och utbildningsadministration för provdrift.
- Informationsmaterial för provdrift skickat.
- Dokumentation (driftversion).
- Iordningställd driftmiljö.
- Detaljerad plan för drift konverteringen.
- Omlägningsplan för skarp drift.
- Förberedelser för skarp drift klara.
- Etablerad driftorganisation ansvarar för driftförvaltningen.
- Överlämnandet genomfört enligt plan.

4.5 Driftsättning

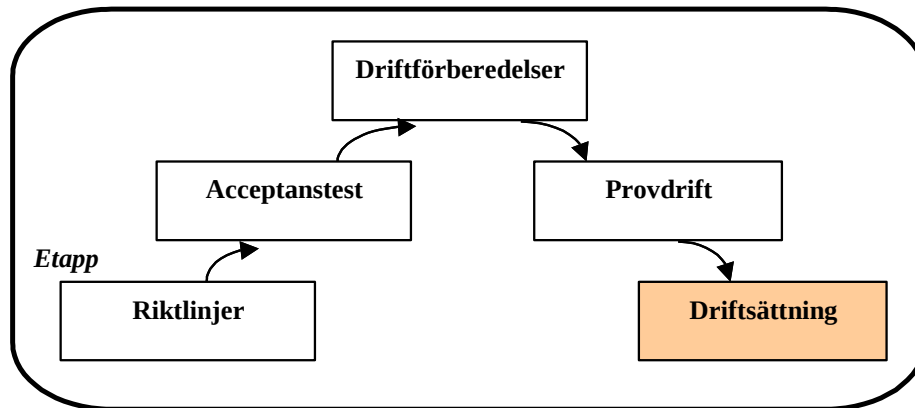

Mål

Det nya systemet eller nya systemversionen i skarp drift på samtliga enheter. Förvaltningsorganisationen övertar ansvaret och Införandeprojektet avvecklas.

Underlag/förutsättningar

- Provdriften genomförd på ett säkert och samordnat sätt enligt provdriftplan.
- Godkända kopplingar.
- Befintligt system godkänt för avveckling.
- Anpassad organisation, avstämda arbetsrutiner.
- Genomförd utbildning för provdrift.
- Fungerande utbildningssupport, lärarpool och utbildningsadministration för provdrift.
- Informationsmaterial för provdrift skickat.
- Dokumentation (driftversion).
- Iordningställd driftmiljö.
- Detaljerad plan för drift konverteringen.
- Omlägningsplan för skarp drift.
- Förberedelser för skarp drift klara.
- Etablerad driftorganisation ansvarar för driftförvaltningen.
- Överlämnandet genomfört enligt plan.

Resultat

- Den skarpa driften genomförd på ett säkert och samordnat sätt enligt omlägningsplan.
- Kopplingen fungerar i skarp drift.
- Befintligt system avvecklat.
- Fungerande organisation och arbetsrutiner i skarp drift.
- Genomförd utbildning för skarp drift.
- Fungerande utbildningssupport, lärarpool och utbildningsadministration för skarp drift.
- Informationsmaterial för skarp drift skickat.
- Regelbunden trimmad IT-miljö.
- Fungerande driftorganisation och driftförvaltning i skarp drift.
- Förvaltningsorganisationen ansvarar för fortsatt förvaltning.
